ボーリング柱状図

調　　査　　名　三根庁舎南西用地定住促進住宅整備事業地質調査業務委託

事 業 ・ 工 事 名

ボーリングNo.	4	9	3	0	7	3	5	4	0	0	0

シートNo.

ボーリング名	No.2	調査位置	佐賀県三養基郡みやき町大字　市武　地内							北緯	33° 17' 39.1900"
発注機関	三養基西部土地開発公社			調査期間	平成27年 2月18日～　年　月　日					東経	130° 25' 41.7600"
調査業者名	株式会社　有明エンジニアリング 電　話　0952-30-5733	主任技師		現場代理人	安高　進	コア鑑定者	安高　進			ボーリング責任者	岡本　正志
孔口標高	KBM 3.40m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 270° 90° 西 東 180° 南	地盤勾配	0° 水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	吉田製　YBM-05	ハンマー落下用具　トンビ
総掘進長	5.00m								エンジン	ヤンマー製 NFAD-8	ポンプ　吉田製 GP-5

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	粒度試験による土質区分	孔内水位／測定月日
	3.20	0.20	0.20		粘性土						
	1.65	1.55	1.75		粘土						
	-1.00	2.65	4.40		シルト質粘土						
	-1.80	0.80	5.20		砂質シルト						
	-2.30	0.50	5.70		シルト質砂						
	-3.20	0.90	6.60		砂						
	-4.85	1.65	8.25		砂質シルト						
	-5.60	0.75	9.00		砂						
	-6.80	1.20	10.20		シルト混じり砂						
	-7.20	0.40	10.60		砂礫						
	-7.95	0.75	11.35		シルト質粘土						
13	-14.90	6.95	18.30		砂礫						
	-19.60	4.70	23.00		火山灰質砂						
	-20.10	0.50	23.50		粘土						
26											

標準貫入試験

深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1			1/30	1
1.45					
4.15	0	1		1/30	1
4.45	25	5			
5.15	1	2	1	4/30	4
5.45					
6.15	3	4	3	10/30	10
6.45					
7.15	1	1		2/30	2
7.45	19	11			
8.15	1	4	6	11/30	11
8.45					
9.15	1	2	1	4/30	4
9.45					
10.15	4	4	4	12/30	12
10.45					
11.15	1	2	7	10/30	10
11.45					
12.15	9	9	9	27/30	27
12.45					
13.15	6	7	8	21/30	21
13.45					
14.15	8	9	9	26/30	26
14.45					
15.15	6	7	7	20/30	20
15.45					
16.15	9	11	10	30/30	30
16.45					
17.15	12	11	8	31/30	31
17.45					
18.15	7	6	2	15/30	15
18.45					
19.15	2	4	8	14/30	14
19.45					
20.15	11	14	13	38/30	38
20.45					
21.15	10	12	15	37/30	37
21.45					
22.15	13	14	16	43/30	43
22.45					
23.15	2	2	2	6/30	6
23.45					

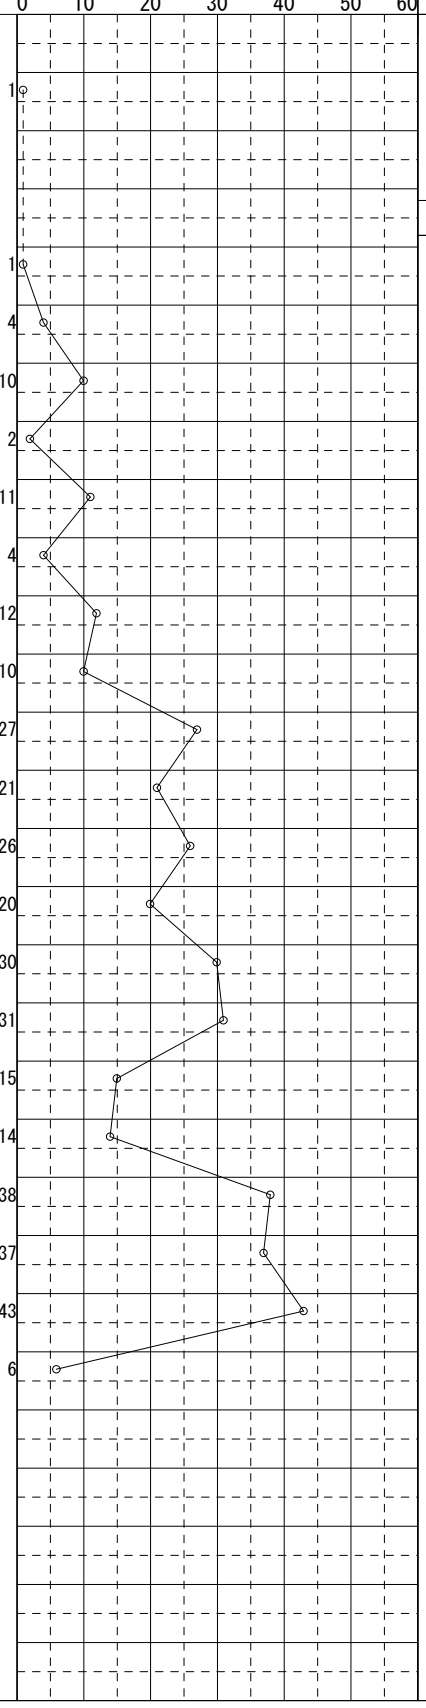

原位置試験 深度 m	試験名及び結果	試料採取 深度 m	試料番号	採取方法	室内試験	掘進月日
3.20	LLT	2.00	2-1	Ⓣ		2/18
3.80		2.80				
