ボーリング柱状図

調　　査　　名　三根庁舎南西用地定住促進住宅整備事業地質調査業務委託

事業・工事名

ボーリングNo.	4	9	3	0	7	3	5	4	0	0	0

シートNo.

ボーリング名	No.3	調査位置	佐賀県三養基郡みやき町大字　市武　地内					北緯	33° 17’ 38.4500″
発注機関	三養基西部土地開発公社			調査期間	平成27年 2月16日～　年　月　日			東経	130° 25’ 41.7500″
調査業者名	株式会社　有明エンジニアリング 電　話　0952-30-5733	主任技師		現場代理人	安高　進	コア鑑定者	安高　進	ボーリング責任者	岡本　正志
孔口標高	KBM 3.31m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 270° 90° 西 東 180° 南	地盤勾配	0° 水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機：吉田製　YBM-05 ハンマー落下用具：トンビ
総掘進長	5.00m								エンジン：ヤンマー製 NFAD-8 ポンプ：吉田製 GP-5

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	粒度試験による土質区分	孔内水位／測定月日
	3.16	0.15	0.15		粘性土						
	1.61	1.55	1.70		粘土						
	-1.29	2.90	4.60		シルト質粘土						
	-1.84	0.55	5.15		砂質シルト						
	-2.59	0.75	5.90		シルト質砂						
	-3.19	0.60	6.50		砂						
	-4.29	1.10	7.60		砂混じりシルト						
	-6.89	2.60	10.20		シルト混じり砂						
13	-15.44	8.55	18.75		砂礫						
	-19.59	4.15	22.90		火山灰質砂						
	-20.79	1.20	24.10		火山灰質粘土						
	-21.19	0.40	24.50		砂						
26	-22.69	1.50	26.00		礫混じり砂						

標準貫入試験

深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/30			1/30	1
1.45					
2.15	ハンマー自沈			0/30	0
2.45					
3.15	ハンマー自沈			0/30	0
3.45					
4.15	ハンマー自沈			0/30	0
4.45					
5.15	1	1	1	3/30	3
5.45					
6.15	3	4	3	10/30	10
6.45					
7.15	1/20	1		2/30	2
7.45					
8.15	2	3	4	9/30	9
8.45					
9.15	1	2	1	4/30	4
9.45					
10.15	3	4	5	12/30	12
10.45					
11.15	8	7	4	19/30	19
11.45					
12.15	7	8	7	22/30	22
12.45					
13.15	9	8	10	27/30	27
13.45					
14.15	10	10	10	30/30	30
14.45					
15.15	5	4	3	12/30	12
15.45					
16.15	10	11	11	32/30	32
16.45					
17.15	8	9	9	26/30	26
17.45					
18.15	10	8	7	25/30	25
18.45					
19.15	12	14	17	43/30	43
19.45					
20.15	11	13	16	40/30	40
20.45					
21.15	8	10	12	30/30	30
21.45					
22.15	10	14	17	41/30	41
22.45					
23.15	2	2	2	6/30	6
23.45					
24.15	7	9	17	33/30	33
24.45					
25.15	14	12	14	40/30	40
25.45					
26.15	12	12	13	37/30	37
26.45					

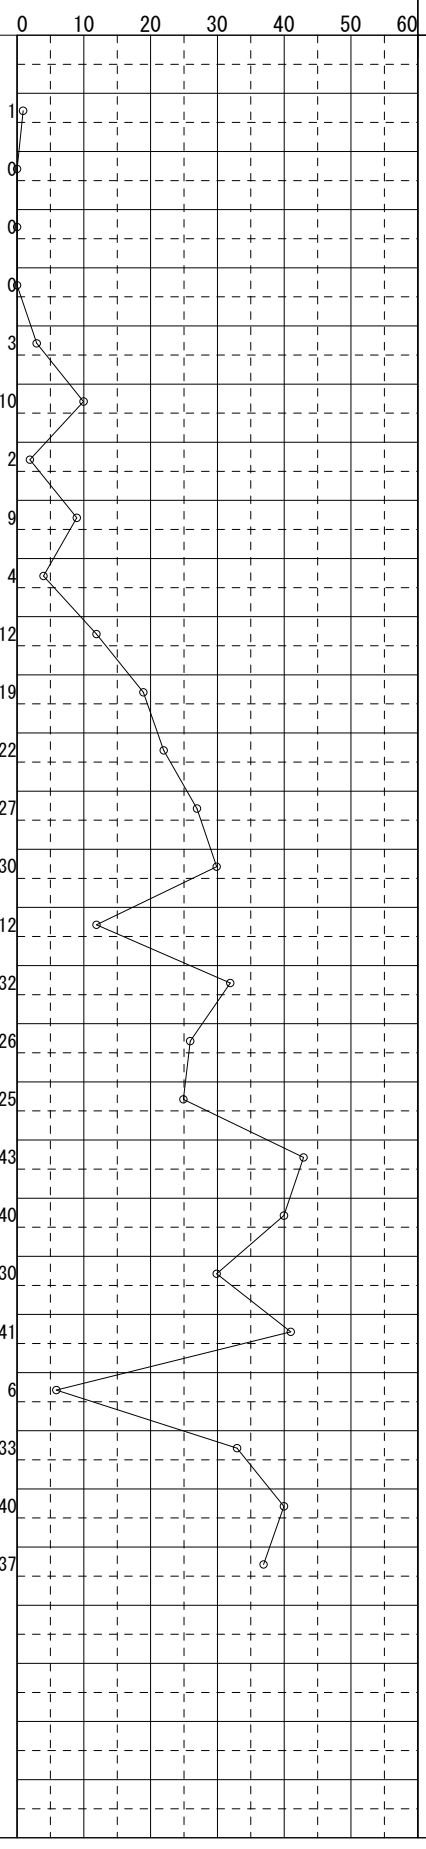

原位置試験 深度 m	試験名及び結果

試料採取 深度 m	試料番号	採取方法	室内試験	掘進月日
